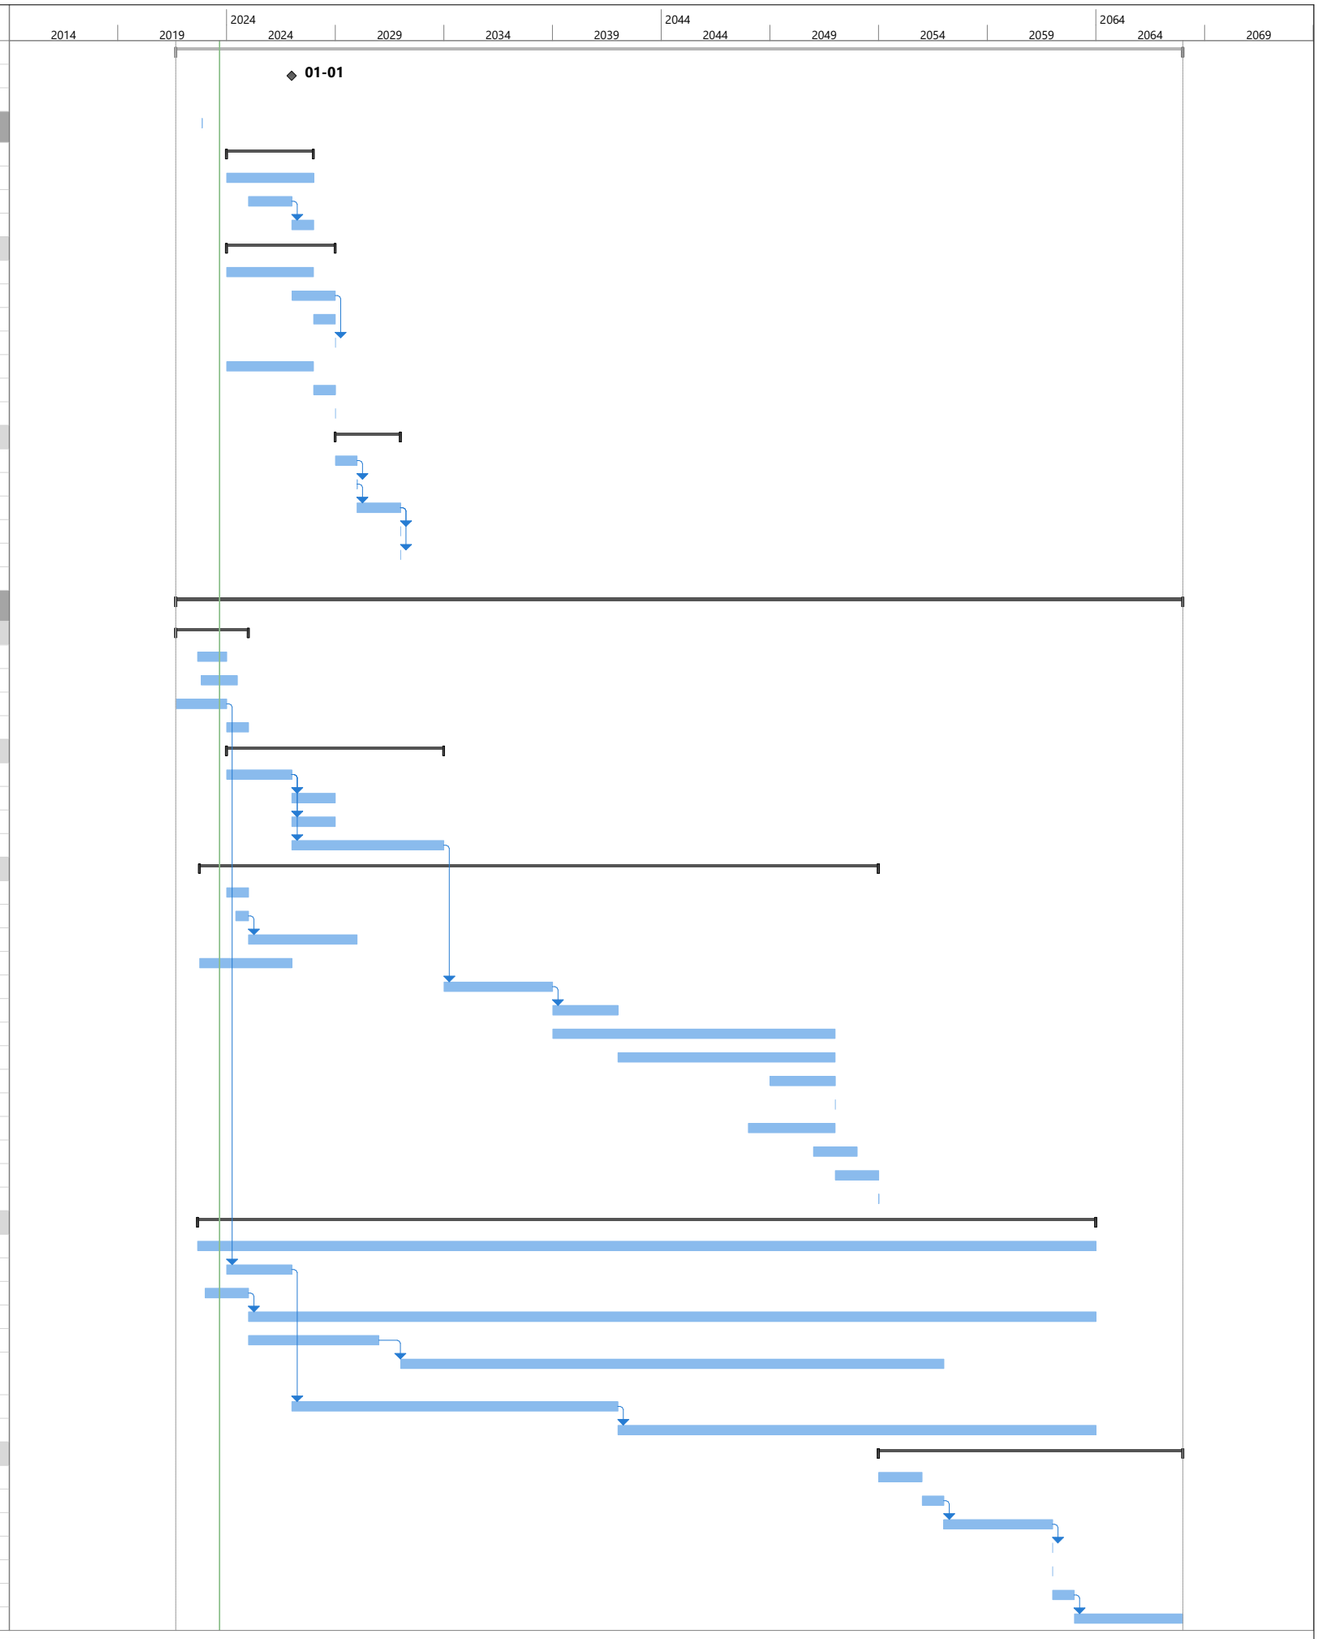Id	Opgavetils	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
0		**Langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald**	**12088 dage**	**on 01-09-21**	**fr 30-12-67**	
1		NB: En forudsætning for denne plan er, at alt affald står på NOL	0 dage	fr 01-01-27	fr 01-01-27	
2						
3		**Modtage- og håndteringsfacilitet på Risø**	1 dag	ma 14-11-22	ma 14-11-22	
4		**Forberedelsesfase**	**1045 dage?**	**ma 01-01-24**	**fr 31-12-27**	
5		Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne	1045 dage?	ma 01-01-24	fr 31-12-27	
6		Kravspecifikation	522 dage?	on 01-01-25	to 31-12-26	
7		Projektforslag	261 dage?	fr 01-01-27	fr 31-12-27	6
8		**Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde**	**1306 dage?**	**ma 01-01-24**	**ma 01-01-29**	
9		Sikkerhedsvurdering	1043 dage?	ma 01-01-24	on 29-12-27	
10		Miljøkonsekvensvurdering	520 dage?	ma 04-01-27	fr 29-12-28	
11		ESPOO-høring	260 dage?	ma 03-01-28	fr 29-12-28	
12		Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven	1 dag	ma 01-01-29	ma 01-01-29	10
13		Artikel 37 høring	1043 dage?	ma 01-01-24	on 29-12-27	
14		Lokalplan og evt. kommuneplantillæg	260 dage?	ma 03-01-28	sø 31-12-28	
15		Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder	1 dag?	ma 01-01-29	ma 01-01-29	
16		**Konstruktion**	**783 dage?**	**ti 02-01-29**	**to 01-01-32**	
17		Projektering	260 dage?	ti 02-01-29	ma 31-12-29	
18		Byggeansøgning inkl. byggetilladelse	1 dag?	ti 01-01-30	ti 01-01-30	17
19		Konstruktion	520 dage?	on 02-01-30	ti 30-12-31	18
20		Ibrugtagningstilladelse fra kommunen	1 dag	to 01-01-32	to 01-01-32	19
21		Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder	1 dag?	to 01-01-32	to 01-01-32	19
22						
23		**Slutdepot**	**12088 dage?**	**on 01-09-21**	**fr 30-12-67**	
24		**Forberedelsesfase**	**870 dage?**	**on 01-09-21**	**ti 31-12-24**	
25		Implementeringsplan for slutdepot	347 dage?	to 01-09-22	sø 31-12-23	
26		Requirements Management (EURAD test-projekt)	434 dage?	ti 01-11-22	fr 28-06-24	
27		Generisk depotkoncept	608 dage?	on 01-09-21	sø 31-12-23	
28		Revurdering af budget for slutdepot	262 dage?	ma 01-01-24	ti 31-12-24	
29		**Valg af lokation**	**2609 dage?**	**ma 01-01-24**	**to 29-12-33**	
30		Politisk proces med kommuner (herefter løbende interessentinddragelse)	784 dage?	ma 01-01-24	to 31-12-26	
31		Geologiske undersøgelser og prøvetagning	521 dage?	fr 01-01-27	fr 29-12-28	30
32		Socioøkonomisk analyse af lokationsområdet	521 dage?	fr 01-01-27	fr 29-12-28	30
33		Valg af lokation, herunder vidensopbygning og borgermøder i lokalsamfundene	1825 dage?	fr 01-01-27	to 29-12-33	30
34		**Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde**	**8154 dage?**	**ma 03-10-22**	**to 01-01-54**	
35		Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne	261 dage?	ti 02-01-24	ti 31-12-24	
36		GAP-analyse omkring lovgivning og vejledningsmateriale	152 dage?	ma 03-06-24	ti 31-12-24	
37		Eventuelt ny lov om nukleare anlæg (slutdepot)	1304 dage?	on 01-01-25	ma 31-12-29	36
38		Foreløbig sikkerhedsvurdering	1109 dage?	ma 03-10-22	to 31-12-26	
39		Depotkoncept, herunder yderligere geologiske undersøgelser	1304 dage?	ma 02-01-34	to 30-12-38	33
40		Projektforslag for endeligt slutdepot	782 dage	ma 03-01-39	ti 31-12-41	39
41		Sikkerhedsvurdering	3390 dage?	ma 03-01-39	fr 29-12-51	
42		Miljøkonsekvensvurdering	2608 dage?	on 01-01-42	fr 29-12-51	
43		ESPOO-høring	781 dage?	fr 01-01-49	sø 31-12-51	
44		Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven	1 dag	ma 01-01-52	ma 01-01-52	
45		Artikel 37 høring	1043 dage?	on 01-01-48	fr 29-12-51	
46		Anlægslov	522 dage?	ma 02-01-51	ti 31-12-52	
47		Lokalplan og evt. kommuneplantillæg	523 dage?	ma 01-01-52	on 31-12-53	
48		Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder	1 dag	to 01-01-54	to 01-01-54	
49		**Affaldshåndtering**	**10783 dage?**	**to 01-09-22**	**ma 31-12-63**	
50		Waste Management Plan (Løbende plan for håndtering af affald)	10783 dage?	to 01-09-22	ma 31-12-63	
51		Generiske WAC slutdepot	784 dage?	ma 01-01-24	to 31-12-26	27
52		Plan for R&D	522 dage?	ma 02-01-23	ti 31-12-24	
53		R&D - test/forsøg	10174 dage	on 01-01-25	ma 31-12-63	52
54		Affaldsveje til slutdepot	1566 dage	on 01-01-25	on 01-01-31	
55		Klargøring af affald inden færdigkonditionering (karakterisering, sortering, volumenreduktion o.l.)	6522 dage?	to 01-01-32	fr 29-12-56	54
56		WAC slutdepot	3913 dage?	fr 01-01-27	ti 31-12-41	51
57		Færdigkonditionering af affald	5739 dage?	on 01-01-42	ma 31-12-63	56
58		**Konstruktion**	**3652 dage?**	**to 01-01-54**	**fr 30-12-67**	
59		Projektering	522 dage?	to 01-01-54	fr 31-12-55	
60		Byggeansøgning inkl. byggetilladelse	260 dage?	ma 03-01-56	fr 29-12-56	
61		Konstruktion	1305 dage?	ma 01-01-57	fr 30-12-61	60
62		Ibrugtagningstilladelse fra kommunen	1 dag	ma 02-01-62	ma 02-01-62	61
63		Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder	1 dag	ma 02-01-62	ma 02-01-62	
64		Transporttilladelse i henhold til ADR-konventionen	260 dage	ma 02-01-62	fr 29-12-62	
65		Transport af affald og fyldning af slutdepot	1305 dage?	ma 01-01-63	fr 30-12-67	64
